


変更 1 回目 工程表

工事番号	令和4年度 西土第59号	工期	自 令和 5 年 3 月 23 日 至 令和 6 年 3 月 15 日	新潟県 新潟市 西区 黒鳥1450番地
工事名	文京町五十嵐二の町線2号 堀割橋塗装塗替工事			受注者 株式会社 トーホー
工事場所	新潟県 新潟市 西区 関屋堀割町 地内			

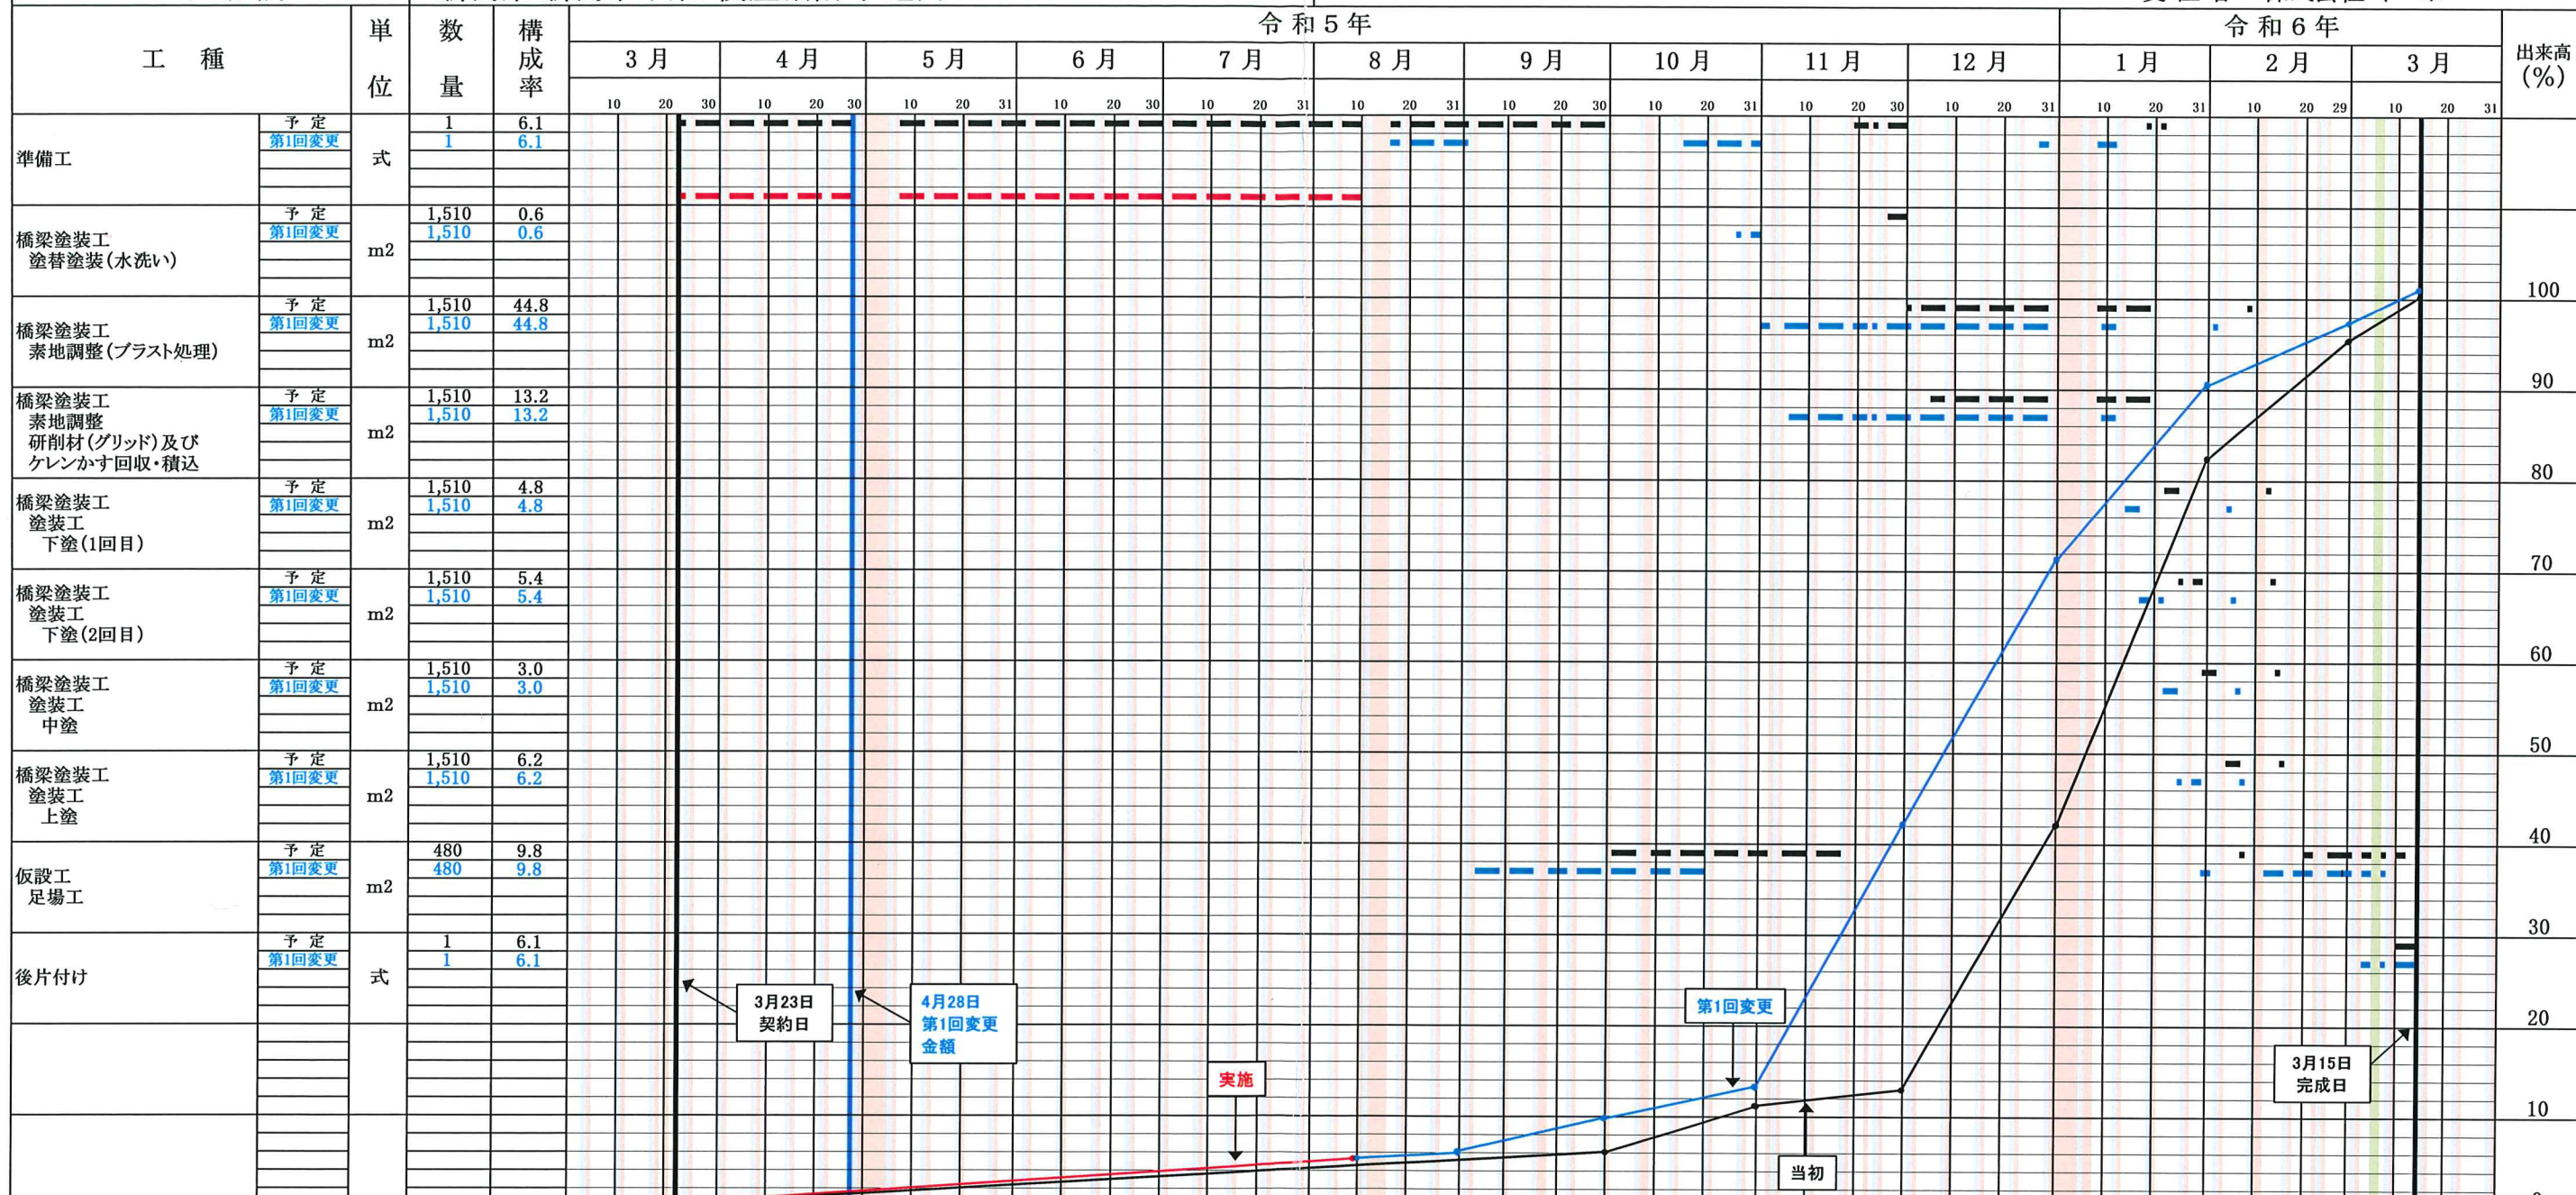

■ 当初	予定	0.1 %	1.1 %	2.1 %	3.1 %	4.1 %	5.1 %	6.1 %	11.1 %	13.2 %	42.3 %	82.4 %	95.6 %	100.0 %
■ 第1回変更	第1回変更	0.1 %	1.3 %	2.5 %	3.7 %	4.9 %	6.1 %	10.1 %	13.2 %	42.3 %	71.2 %	90.6 %	96.1 %	100.0 %
■ 実施	実施	0.1 %	1.3 %	2.5 %	3.7 %	4.9 %	5.3 %							
段階確認予定										・素地調整状況(11月上旬~下旬)	・素地調整状況(12月上旬~下旬)	・素地調整完了(1月中旬)	・各工程塗装工(2月上旬~中旬)	・塗装工空缶(3月上旬)
材料確認予定									・研削材(10月下旬)	・有機ジソク(10月下旬)	・研削材(11月上旬)	・有機ジソク(12月上旬)	・下塗材、中塗材、上塗材(1月上旬)	
中間技術検査予定													・中間技術検査(2月中旬)	
社内検査予定											・素地調整完了(12月下旬)	・素地調整完了(1月中旬)	・中塗工(2月上旬)	・各工種書類(3月中旬)
